



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
 Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social
 Departamento de Popularização da Ciência, Tecnologia e Educação Científica
 Coordenação-Geral de Educação Científica
 Coordenação de Educação Científica

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

1. IDENTIFICAÇÃO

Processo: 01245.003666/2022-23
Instrumento: Termo de Fomento nº 930170/2022
Objeto: "Desenvolver escola de programadores com foco em competências de cultura digital, visando as carreiras científicas e tecnológicas"
Concedente: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI
Proponente: Associação Casa do Pai
Local de Implantação: Associação Casa do Pai no Estado do Rio de Janeiro
Valor de repasse do Concedente: R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
Valor de contrapartida do Proponente: Sem contrapartida
Valor Total: R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
Origem do Recurso: Programa: 2204 - Brasil na Fronteira do Conhecimento Funcional Programática 19.572.2204.6702.0033 – Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Pesquisa e Desenvolvimento - no Estado do Rio de Janeiro. Emenda Parlamentar Individual Impositiva nº 39810010 de autoria do Dep. Federal Felício Laterça Fonte de recursos: 188 PTRES: 208203 GND 3.3.90 (custeio – Serviço, Tributo e Bem de consumo) e 4.4.90 (capital – Bem de investimentos)
Vigência inicial: 08/08/2022
Vigência final: 30/09/2024

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

- O presente relatório de visita técnica tem por objetivo apresentar o resultado da avaliação realizada *in loco* na Associação Casa do Pai, no município de Itaguaí-RJ. A visita ocorreu em 12/03/2024, das 11 às 16h, e teve por objetivo avaliar a regular execução do Termo de Fomento, que tem por objeto "Desenvolver escola de programadores com foco em competências de cultura digital, visando as carreiras científicas e tecnológicas".
- Os fiscais que subscrevem o presente relatório foram formalmente designados pela Portaria SEDES/MCTI n.º 7586, de 26 de outubro de 2023 (11472498).

3. SÍNTESE DA VISITA TÉCNICA

- A visita técnica buscou avaliar a regular execução do projeto. Neste sentido, foram utilizados como parâmetros de avaliação as metas e etapas pactuadas no Plano de Trabalho, a saber:

Meta	Etapa
1- Planejamento, desenvolvimento, implantação e manutenção de laboratório tecnológicos de educação digital e das Capacitações do Lab Social.	Aquisição de material de consumo e uniforme.
	Aquisição de Material para Identificação e Divulgação.
	Aquisição de Material Permanente.

	Contratação de Prestador de serviço (PJ).
	Contratação de Recursos Humanos.
	Tributos
2 - Contratação de serviços de terceiros para gestão, segurança e eventos sobre tecnologia.	Contratação de Prestador de serviço (PJ)
3 - Complementação da Meta 1 para pagamento de tributos.	Pagamento de Tributos dos monitores.
4 - Complementação da Meta 1 para complemento da compra do telão de led outdoor 3x1.	Complemento da compra do telão de led outdoor 3x1.

4. No plano de aplicação detalhado foram listados os itens de bens e serviços que foram aprovados para a execução do projeto:

Tipo Despesa	Descrição
SERVICO	Palestrantes
BEM	Kit Educacional Mostrabot REPTO
BEM	Kit Placa Maker 1
BEM	Kit Robô Desenhista REPTO Art 10
BEM	Kit Atto Educacional 6.000 peças
BEM	Kit Robótica baseados em Arduino
BEM	Cartazes A3 papel couche 150g
BEM	Banners 1x0,80 lona brilho 280g com bas
BEM	Placa 1x1 - Lona Brilho 280G Modulada em
BEM	Camisa com logomarcada - Tecido Dry Fit
BEM	Projetor Multimídia
BEM	Monitor 17 HDMI
BEM	Kit Teclado e Mouse
BEM	Extensão com Régua
BEM	Roteador WiFi 5G
BEM	Caixa de Som com auto falante
BEM	Armário com Chave
BEM	Cadeiras Coloridas
BEM	Mesa estação 08 lugares
BEM	Mesa estação 12 lugares
BEM	Estação Multimídia/Robô Jabuti Edu.
BEM	Arena IoT 1m x 0,70
SERVICO	Serviço de especializado em eventos e re
BEM	Folderes 15x21 papel couche 100g
BEM	Kit Maquina Router Laser Corte e Gravação
BEM	Tv Led 65
BEM	Notebook
BEM	Painel Led outdoor 3x1
BEM	Painel Led outdoor 3x1
SERVICO	Gestão Técnica do Projeto
SERVICO	Prestação de Serviços de Consultoria em
SERVICO	Serviços de segurança
SERVICO	Serviços de alimentação
SERVICO	Assessoria comunicação
SERVICO	Monitores
SERVICO	Coordenador de Projeto
SERVICO	Agente Comunitário
SERVICO	Assistente Administrativo

SERVICO	Coordenador de Pedagógico
SERVICO	Assessoria Contábil
SERVICO	Assessoria, Suporte Técnico e Pedagógico
TRIBUTO	Encargos de Coordenador Pedagógico (INSS)
TRIBUTO	Encargos de Assistente Administrativo (I
TRIBUTO	Encargos de Monitores (INSS Patronal -co
TRIBUTO	Encargos de Monitores (INSS Patronal - 20%)
TRIBUTO	Encargos de Coordenador de Projeto (INSS)
TRIBUTO	Encargos de Agente Comunitário (INSS Pa
SERVICO	Serviços de Internet

5. A visita procurou avaliar, por amostragem, se os equipamentos solicitados foram devidamente instalados e disponíveis para o público atendido. Neste sentido, foram observados, conforme imagens abaixo, que os itens acima descritos foram regularmente inseridos nas atividades da instituição.

6. A visita técnica foi conduzida pelo Sr. Waldemar Ávila – Representante da Associação Casa do Pai, e pela Senhora Rafaella Mello – Presidente da Associação Casa do Pai.

7. Foram visitadas as dependências da sede da instituição, sendo observadas várias salas, cujos alunos encontravam-se em aulas, como ballet, panificação, maquiagem, barbearia, corte e costura e macramê. No setor de tecnologia, onde foi implantado o laboratório *maker*, foram observados laboratórios de informática, com turmas de para crianças, jovens, adultos e idosos.


FACHADA DO INSTITUTO CASA DO PAI



FACHADA E LAB SOCIAL



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

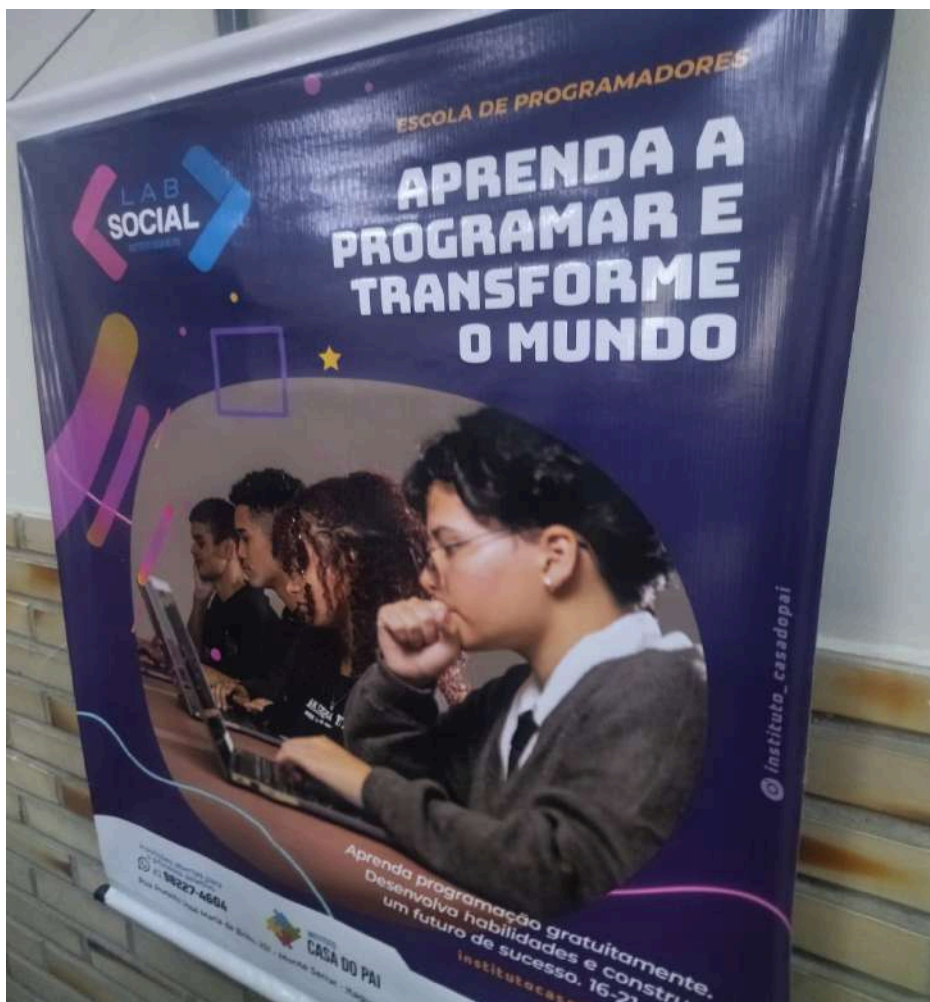

ALUNOS UNIFORMIZADOS USANDO KITS DE INFORMÁTICA



IMPRESSORAS 3D




ALUNOS DE INICIAÇÃO PROGRAMAÇÃO





PROFESSORES EM AULA

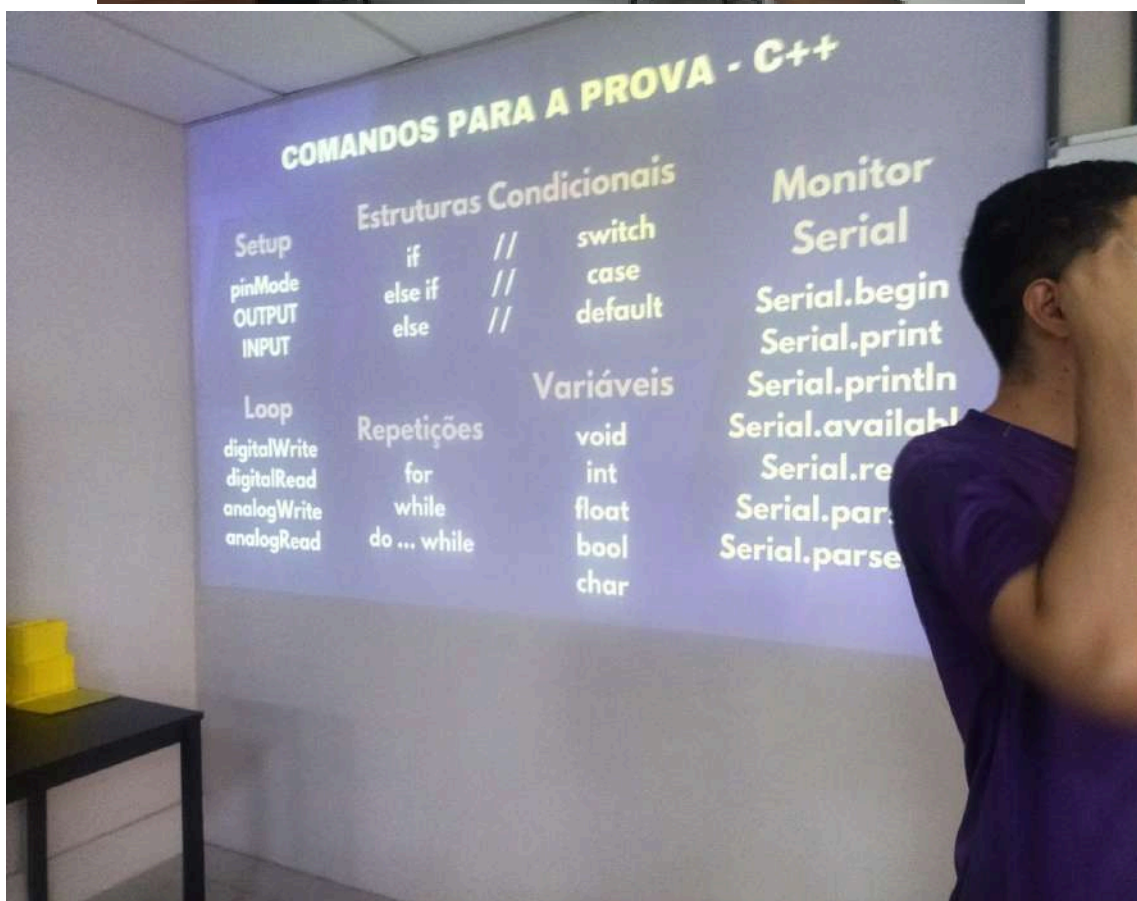

KITS DE ROBÓTICA



ROBÔS MONTADOS PELOS ALUNOS




PRESTADORES DE SERVIÇO





CAIXAS DE SOM E TELA DE LED

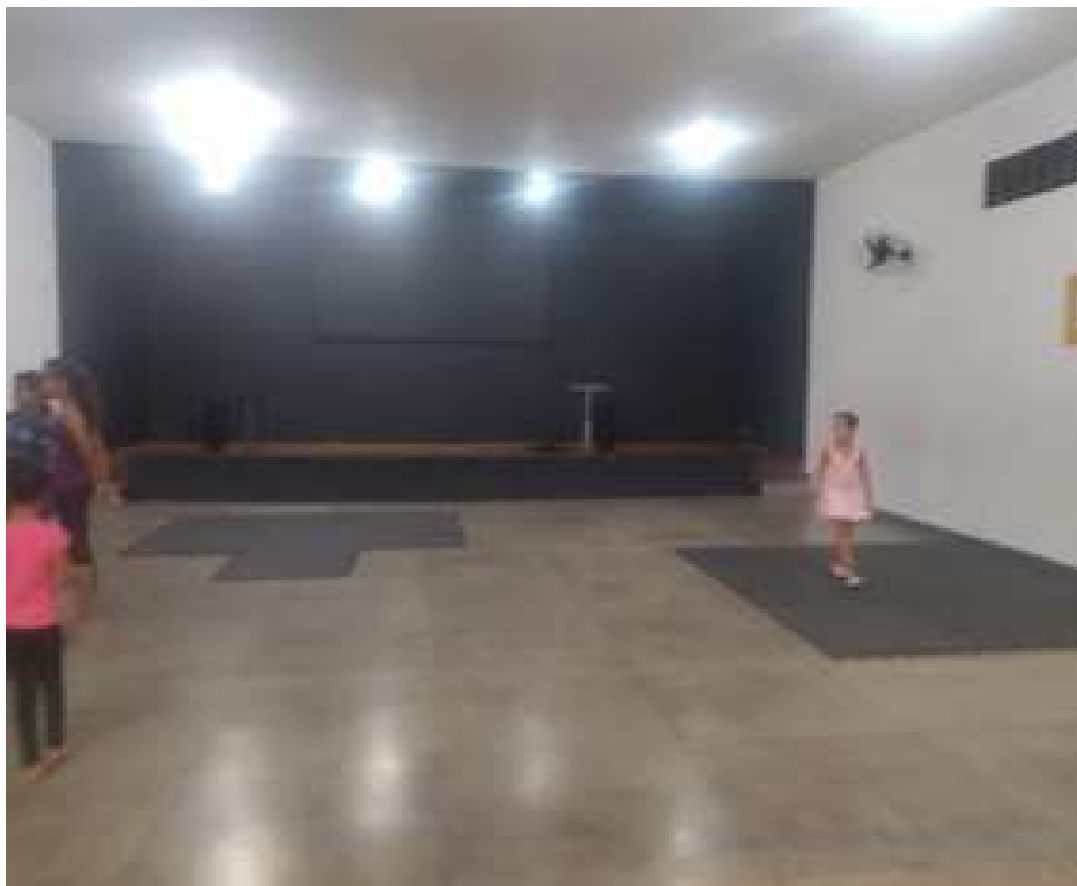

FILA DA COMUNIDADE BUSCANDO VAGA EM CURSOS



VISITA AO POLO TECNOLÓGICO



8. Após a visita às instalações, foi realizada reunião entre a diretoria do Instituto com a equipe de fiscais, sendo realizadas orientações acerca da execução do termo de fomento, bem como foram relatados desafios enfrentados pela instituição para continuidade das atividades, situação que deve ser avaliada pelo MCTI, pois o projeto tem o seu término previsto para 30/09/2024, e os impactos sociais que os cursos promovem na localidade foram observados por esta equipe técnica. A descontinuidade do projeto pode gerar prejuízos, tanto de ordem social, como de ordem econômica, uma vez que os

equipamentos ali instalados, que são modernos, podem deixar de ser utilizados, pois a OSC não conseguiu viabilizar emenda parlamentar neste ano de 2024 para continuidade das ações. Neste sentido, sugere-se avaliar a possibilidade de apoio discricionário para continuidade projeto sobredito.

4. CONCLUSÃO

9. A visita técnica realizada na Associação Casa do Pai no contexto do Termo de Fomento nº 930170/2022 revelou uma série de aspectos relevantes para a avaliação da execução do projeto e para a continuidade das atividades.

10. Em síntese, observou-se que os recursos repassados pelo Concedente estão sendo regularmente aplicados conforme o Plano de Trabalho estabelecido, resultando na implantação e operacionalização de um laboratório tecnológico de educação digital. Este laboratório, composto por uma diversidade de equipamentos e materiais, demonstra estar em pleno funcionamento e atendendo aos objetivos propostos, como a capacitação de jovens e adultos nas competências necessárias para as carreiras científicas e tecnológicas.

11. A presença de alunos participando ativamente das atividades oferecidas, bem como a diversidade de cursos disponibilizados pela Associação Casa do Pai, evidenciam o impacto social positivo gerado pelo projeto na comunidade local. Além disso, a instituição demonstrou comprometimento e diligência na execução das atividades, evidenciando uma gestão responsável dos recursos recebidos.

12. Contudo, identificou-se um desafio significativo para a continuidade das atividades após o término do período de vigência do Termo de Fomento. A falta de garantia de recursos futuros pode comprometer a sustentabilidade do projeto e a manutenção dos investimentos realizados, o que poderia resultar em perdas tanto para a comunidade atendida quanto para a própria instituição.

13. Diante desse cenário, sugere-se uma avaliação por parte do MCTI sobre a possibilidade de apoio discricionário para a continuidade do projeto, considerando os impactos sociais positivos já observados e a importância de se manter os investimentos realizados em infraestrutura e capacitação tecnológica. Além disso, recomenda-se que a Associação Casa do Pai busque alternativas de captação de recursos e parcerias locais para garantir a continuidade das atividades no longo prazo.

14. Em suma, a visita técnica evidenciou o êxito do projeto até o momento e a necessidade de medidas adicionais para assegurar sua continuidade e maximizar seu impacto na comunidade.

Gestores do Termo de Fomento <i>(Portaria sedes/mcti n.º 7586, de 26 de outubro de 2023)</i>	
<i>(assinado eletronicamente)</i> GERSON DE JESUS MARTINS Coordenador de Educação Científica	<i>(assinado eletronicamente)</i> ELIEZO ALVES DE SOUSA Agente Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Eliezo Alves de Sousa, Agente Administrativo**, em 23/04/2024, às 14:36 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gerson de Jesus Martins, Coordenador de Educação Científica**, em 23/04/2024, às 15:00 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11902672** e o código CRC **E4E9982A**.

Referência: Processo nº 01245.003666/2022-23

SEI-MCTI nº 11902672
